

Zpráva o plnění Akčního plánu 2020-2021

Na základě návrhu implementace Strategického plánu bylo k datu 15. 11. 2021 vyhotoveno toto zhodnocení plnění Akčního plánu 2020–2021.


Zastupitelstvo města schválilo Strategický plán rozvoje města Šlapanice 2020–2025 na svém 7. zasedání konaném 4.12.2019.

Návrh implementace doporučuje schůzku Řídící komise dvakrát ročně. Pandemický vývoj v ČR znemožnil na jaře setkání řídicí skupiny, proto proběhlo vyhodnocení plnění akčního plánu na schůzce řídicí skupiny dne 12. 10. 2021 na základě podkladů vedením města a OISM, kteří jsou garantem většiny aktivit.

Grafické znázornění plnění Akčního plánu 2020–2021

V akčním plánu jsou aktivity rozděleny do 2 základních skupin.

- 1) Aktivity s plánovaným termínem realizace v letech 2020–2021, kde jsou uvedeny investiční akce na plánované období

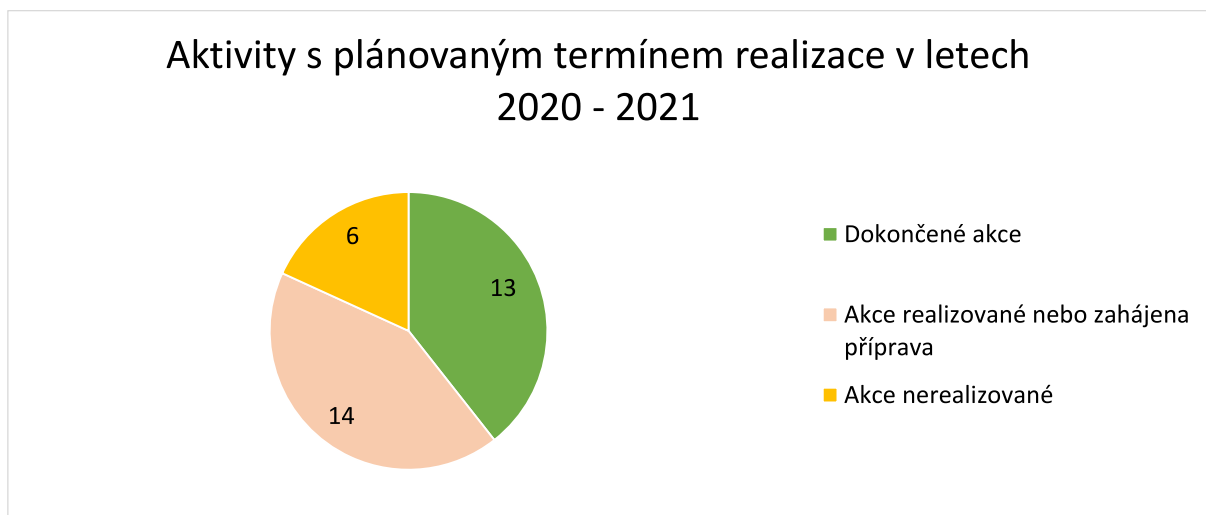



- 2) Přehled průběžně realizovaných aktivit, které zahrnují každoroční akce. Některé s těchto aktivit mají zahájení plánované až od roku 2021.



Akční plán je členěn podle pólů rozvoje, které navazují na strategické cíle rozvoje. Jedná se o tyto:

A. Život ve městě	B. Udržitelný rozvoj	C. Prostředí ve městě
A.1 Školství	B.1 Moderní úřad	C.1 Vzhled města
A.2 Aktivní volný čas	B.2 Bydlení	C.2 Životní prostředí
A.3 Kultura ve městě	B.3 Místní ekonomika	
A.4 Sociální a zdravotní služby	B.4 Rozvoj dopravy	
	B.5 Technická infrastruktura a odpady	

Plnění dle pólů rozvoje

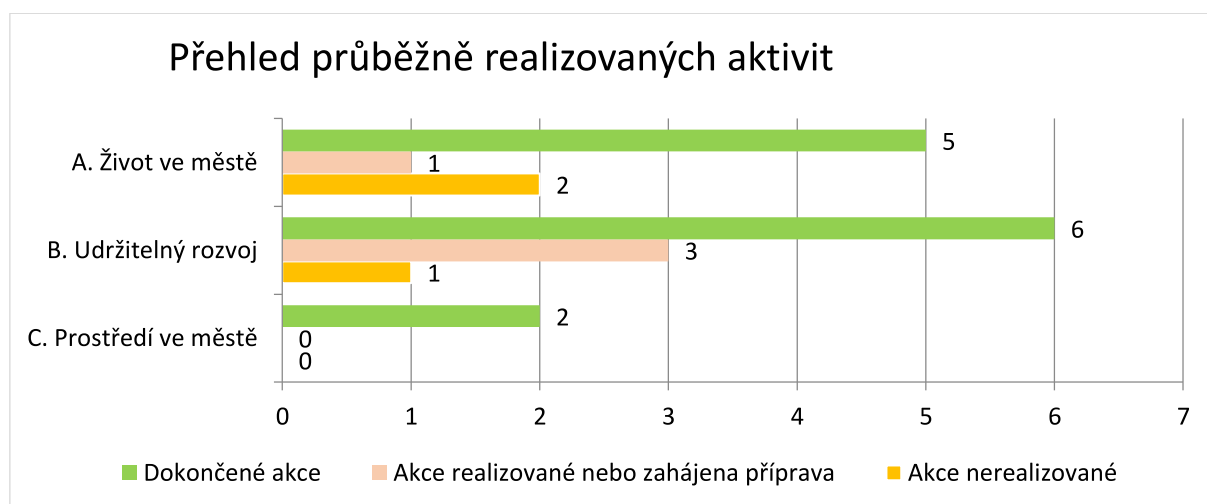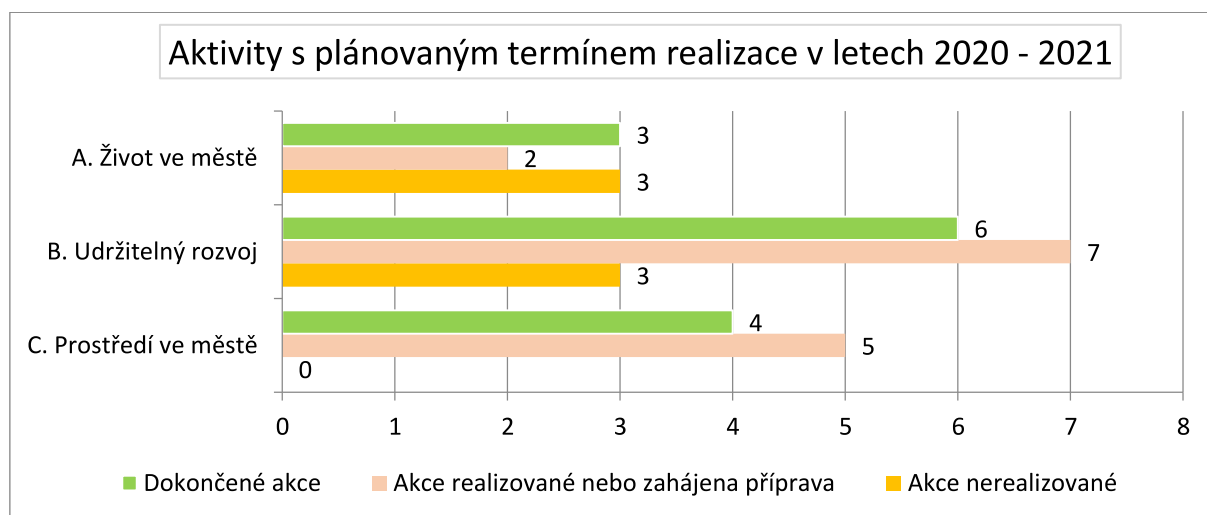

Soupis aktivit z Akčního plánu 2020–2021

V následující tabulce je průběh realizace stejně jako v předchozích grafech barevně rozlišen na Dokončené akce (zelená), Akce realizované nebo zahájena příprava (béžová) a Akce nerealizované (oranžová).

U každé akce je uveden stav, finanční nároky na rozpočet, případné financování z dotací a případný důvod, proč k realizaci nedošlo.

Aktivity s plánovaným termínem realizace v letech 2020 - 2021

Níže jsou uvedeny aktivity s plánovaným termínem realizace v letech 2020 až 2021. Odhad nákladů na realizaci je u každé aktivity rozepsán do dvou let. Je to zejména z důvodu ulehčení tvorby rozpočtu a rozpočtového výhledu města.

A.1 Školství

Id.	Název aktivity/projektu	Důležitost	Garant	Termín realizace	Odhad nákladů na realizaci v roce 2020 (v tis. Kč)	Odhad nákladů na realizaci v roce 2021 (v tis. Kč)	Zdroj financování
A.1.1	Rozšíření kapacity kuchyně ZŠ (pavilon C)	Vysoká	OISM	do 2020	14 000	-	Rozpočet města/dotace
	<i>Stavba byla dokončena a zkolaudována 8/2020</i>				4 879	-	<i>rozpočet města</i>
	<i>Dotace v celkové výši 15.630 tis., z toho proplaceno v roce 2019 5.261 tis.</i>				10 369	-	<i>dotace 2020</i>
A.1.2	Stavba nové sportovní haly u ZŠ (pavilon G)	Vysoká	OISM	do 2020	36 000	-	Rozpočet města/dotace
	<i>Stavba byla dokončena a zkolaudována 10/2020</i>				19 277	-	<i>rozpočet města</i>
	<i>Dotace v celkové výši 25.242 tis., z toho proplaceno v roce 2019 9.060 tis.</i>				16 182	-	<i>dotace 2020</i>
A.1.3	Rozšíření kapacity ZŠ (pavilon F) - 10 tříd včetně vybavení	Vysoká	OISM	do 2020	101 000	-	Rozpočet města/dotace
	<i>Stavba byla dokončena a zkolaudována 10/2020</i>				29 319	-	<i>rozpočet města</i>
	<i>Dotace v celkové výši 67.643 tis.</i>				67 643	-	<i>dotace 2020</i>
A.1.4	Rozšíření kapacity MŠ <i>(od podzimu 2019 se zpracovává studie k aktivitě, na to naváže vypracování projektu a samotná realizace).</i>	Vysoká	OISM	2021-2022	-	Nyní nelze určit	Rozpočet města/dotace
	<i>Byla provedena studie proveditelnosti projektu MŠ Husova a rozšíření kapacit MŠ Hvězdíčka</i>				93	-	<i>rozpočet města</i>

	Zpracován projekt na MŠ Husova - Čtyřstěn s.r.o. (nyní žádost o stavební povolení)				205	894	rozpočet města
	Příprava rozšíření na Masarykově náměstí				-	206	rozpočet města
	realizace v roce 2022 (předpoklad dotace)				-	-	rozpočet/dotace
A.1.5	Posílení rozvoje vzdělávání - vytvoření pracovního místa ve škole pro zajišťování rozvoje vzdělávání	Střední	1.místostarosta/ ZŠ Šlapanice	2021	-	Nyní nelze určit	Rozpočet města/dotace
	realizace v roce 2021						
	manažerské vzdělávání vedení ZŠ (dále realizovat průběžně přes MAS, nikoliv vytvořením prac.místa)					50	rozpočet města
A.1.6	Finanční podpora nadaných dětí v dalším vzdělávání	Střední	1.místostarosta/ ZŠ Šlapanice	2021	-	300	Rozpočet města/dotace
	realizace v roce 2021						
	nerealizováno (dále řešit průběžně formou individuálních dotací)						
A.1.7	Podpora alternativního vzdělávání (poskytnutí prostor, podpora)	Střední	1.místostarosta/ ZŠ Šlapanice	2021	-	200	Rozpočet města
	realizace v roce 2021						
	odloženo						

A.2 Aktivní volný čas

Id.	Název aktivity/projektu	Důležitost	Garant	Termín realizace	Odhad nákladů na realizaci v roce 2020 (v tis. Kč)	Odhad nákladů na realizaci v roce 2021 (v tis. Kč)	Zdroj financování
A.2.2	Vypracování koncepce sportu ve městě	Vysoká	Starostka	2020	50	-	Rozpočet města
	RM z finančních důvodů navrhuje nyní nerealizovat (pro dotace není požadováno)					-	

B.1 Moderní úřad

Id.	Název aktivity/projektu	Důležitost	Garant	Termín realizace	Odhad nákladů na realizaci v roce 2020 (v tis. Kč)	Odhad nákladů na realizaci v roce 2021 (v tis. Kč)	Zdroj financování
B.1.1	Přijetí nového územního plánu.	Vysoká	Starostka/ 1.místostarosta	2020	-	-	Rozpočet města
	<i>Veřejné projednání ÚP proběhlo 8/2020, zpracovávají se námítky a připomínky, posun termínu na 2021, opakované veřejné projednání kvůli AZUR JMK č.1</i>				-	-	
	<i>Opakované veřejné projednání ÚP 11-12/2021</i>				-	-	
B.1.2	Vytvoření urbanisticko - dopravní studie <i>(studie bude také řešit dopravní terminál, dopravní toky ve městě, kamionovou dopravu atd.).</i>	Vysoká	Starostka/ 1.místostarosta	2020	1 200	-	Rozpočet města/ dotace
	<i>Realizuje se, dokončena 2.etapa, konec studie 12/2021</i>				768	1 152	rozpočet města
B.1.3	Vytvoření studie (koncepce) lokality Cukrovar.	Vysoká	Starostka/ 1.místostarosta	2021	-	1 200	Rozpočet města/ dotace
	<i>Běží soutěž o návrh</i>				-	315	
B.1.5	Digitalizované podklady a mapy <i>(technická mapa, pasporty apod.)</i>	Střední	OISM	2021	-	750	Rozpočet města
	<i>realizace v roce 2021</i>					154	
B.1.6	Elektronická úřední deska <i>(rozvoj e-governmentu, kalendář akcí, pozvánky, propagace, komunikace)</i>	Střední	Starostka	2021	-	1 500	Rozpočet města
	<i>realizace v roce 2021</i>				-	-	
	<i>odloženo, v rozpočtu na rok 2022</i>				-	-	

B.2 Bydlení

Id.	Název aktivity/projektu	Důležitost	Garant	Termín realizace	Odhad nákladů na realizaci v roce 2020 (v tis. Kč)	Odhad nákladů na realizaci v roce 2021 (v tis. Kč)	Zdroj financování
B.2.1	Ubytovací kapacity (pro mladé, seniory, krizové situace)	Vysoká	Starostka/	2020	300	-	Rozpočet města
	1.místostarosta						
	(v první fázi realizace aktivity bude zpracována analýza a vytvořena koncepce rozvoje bytového fondu (300 tis. Kč), následně proběhne implementace koncepce)						
	RM z finančních důvodů navrhuje přesunout realizaci na rok 2021						-
návaznost na Urbanisticko - dopravní studie viz B.1.2 a Studii Cukrovaru, realizace 2022						-	
B.2.2	Analýza územního plánu (plánovaný rozvoj města pro maximální počet obyvatel dle strategického cíle, doporučení pro územní plán, stabilizaci ploch apod.)	Vysoká	Starostka/ 1.místostarosta	2020	400	-	Rozpočet města
	Součást Urbanisticko - dopravní studie viz B.1.2					UDS	-

B.3 Místní ekonomika

Id.	Název aktivity/projektu	Důležitost	Garant	Termín realizace	Odhad nákladů na realizaci v roce 2020 (v tis. Kč)	Odhad nákladů na realizaci v roce 2021 (v tis. Kč)	Zdroj financování
B.3.1	Vytipování prostor pro potřeby rozvoje města <i>(vytvoření seznamu nemovitostí s návrhem využití k podpoře místní ekonomiky. Zjištění možností nebytových prostor, pozemků a prostranství včetně prověření jejich využití pro rozvoj města)</i>	Vysoká	Starostka/ OISM	2020 - 2021	-	300	Rozpočet města
	realizace v roce 2021				-	-	
	prověření platnosti a rozsahu pachtovních smluv, příprava konsolidace budov k prověření na FV				-	-	FV

B.4 Rozvoj dopravy

Id.	Název aktivity/projektu	Důležitost	Garant	Termín realizace	Odhad nákladů na realizaci v roce 2020 (v tis. Kč)	Odhad nákladů na realizaci v roce 2021 (v tis. Kč)	Zdroj financování
B.4.1	Ulice Jungmannova <i>(rekonstrukce ulice - komunikace, chodníky, kanalizace, VO, pravděpodobně i vodovod)</i>	Vysoká	OISM	2020	10 015	-	Rozpočet města
	Stavba byla dokončena 4/2020				10 460	-	rozpočet města
B.4.2	Ulice Lipová <i>(rekonstrukce ulice - komunikace, chodníky, kanalizace, VO, elektro, internet Vivo)</i>	Vysoká	OISM	2020	18 000	-	Rozpočet města
	Stavba dokončena 12/2020				10 131	-	rozpočet města
B.4.3	Ulice Švehlova <i>(rekonstrukce ulice - komunikace, chodníky, VO)</i>	Vysoká	OISM	2021 – 2022	-	22 990	Rozpočet města
	Projekční práce pozastaveny kvůli odvolání proti stavebnímu řízení.				-	-	
	Podána žádost o území rozhodnutí na SÚ, čekáme na zahájení řízení.				-	-	
B.4.4	Ulice Komenského <i>(PD a následná realizace kompletní ulice)</i>	Vysoká	OISM	2021	-	27 000	Rozpočet města
	Probíhají projekční práce pro územní řízení				-	-	
	Stavební povolení speciálních SÚ vydány, čeká se na obecný SÚ s vydáním rozhodnutí na rekonstrukci opěrných zídek.				-	710	rozpočet města
B.4.5	Cyklostezky <i>(Přísp. DSO Šlapanicko, realizace projektu „Stavba integrovaného systému bezpečných cyklostezek na území Šlapanicka“)</i>	Vysoká	Starostka/ 1.místostarosta	2020 - 2021	1 700	-	Rozpočet města/dotace
	Stavba byla dokončena 9/2020				1 688	-	rozpočet města
B.4.6	Radary a přechody <i>(zvýšení bezpečnosti na ulici Nádražní)</i>	Vysoká	OISM	2020	3 200		Rozpočet města

	Realizace pozastavena, měla proběhnout 3/2020, žádost o sloučené řízení, realizace 2022				0	25	rozpočet města
B.4.8	Provoz vnitroměstské linky (případné rozšíření)	Střední	Starostka/ 1.místostarosta/ OISM	2021	-	1 000	Rozpočet města
	realizace v roce 2021				-	-	
	návrh hotov, projednán, z finančních důvodů zatím nerealizováno				-	-	

B.5 Technická infrastruktura a odpady

Id.	Název aktivity/projektu	Důležitost	Garant	Termín realizace	Odhad nákladů na realizaci v roce 2020 (v tis. Kč)	Odhad nákladů na realizaci v roce 2021 (v tis. Kč)	Zdroj financování
B.5.3	Vytvoření standardu technické infrastruktury (standardy umístění sítí, řešení apod.)	Střední	Starostka/ 1.místostarosta/OISM	2020 - 2021	-	300	Rozpočet města
	realizace po dokončení Urbanisticko-dopravní studie				-	-	

C.1 Vzhled města

Id.	Název aktivity/projektu	Důležitost	Garant	Termín realizace	Odhad nákladů na realizaci v roce 2020 (v tis. Kč)	Odhad nákladů na realizaci v roce 2021 (v tis. Kč)	Zdroj financování
C.1.1	Ochranné sanační práce v areálu Cukrovar.	Vysoká	OISM	2020 - 2023	117 000	9 300	Rozpočet města/dotace
	Stavba probíhá, bude dokončena 12/2023, realizuje firma Dekonta a.s.				119 365	27 100	rozpočet města
					100 992	18 432	dotace
C.1.2	Knihovna, kavárna (park, nová knihovna v parku - přesun z náměstí - možnost rozšíření MŠ nebo MěÚ, přebudování stávajícího bistra vč. WC a zázemí pro využití parku)	Vysoká	OISM	2020 - 2022	56 000	3 000	Rozpočet města

	Stavba byla dokončena 9/2021 vč. altánu				5 688	67 485	rozpočet města
C.1.3	Multifunkční dům (obchody, městská policie - přesun z nevyhovujících prostor, dětský + seniorský klub, kanceláře, sociální byt) – objekt Čechova	Vysoká	OISM	2020 - 2023	1 614	22 000	Rozpočet města/dotace
	Probíhají projekční práce pro stavební řízení				493	-	rozpočet města
C.1.4	Rozšíření hřbitova + parkoviště pro ZŠ.	Vysoká	OISM	2020 - 2021	8 000	12 500	Rozpočet města/dotace
	Stavba parkoviště a zdi byla dokončena a zkolaudována 10/2020				14 223	-	rozpočet města
	příprava projektu pro společné územní a stavební řízení				-	-	
C.1.5	Zpracování tzv. Generelu veřejných prostranství (řešení veřejné zeleně, volnočasové plochy atd.)	Vysoká	Starostka/ 1.místostarosta	2020	1 200		Rozpočet města/dotace
	Součást Urbanisticko - dopravní studie - 3.etapa				UDS	UDS	Rozpočet města
C.1.6	Zpracování plánu krajiny (řešení extravilánu)	Vysoká	Starostka/ 1.místostarosta	2021	-	500	Rozpočet města/dotace
	probíhá výběrové řízení na dodavatele, získána dotace, realizace 2022				-	-	dotace 90%

C. 2 Životní prostředí

Id.	Název aktivity/projektu	Důležitost	Garant	Termín realizace	Odhad nákladů na realizaci v roce 2020 (v tis. Kč)	Odhad nákladů na realizaci v roce 2021 (v tis. Kč)	Zdroj financování
C.2.1	Pěší prostupnost krajinou (terénní průzkum pro vytvoření stezek, kde budou řešeny i majetkoprávní vztahy, dojde k postupné realizaci a vytvoření stezek pro zvýšení prostupnosti krajiny)	Vysoká	OISM	2020	200	-	Rozpočet města
	Vytipovány pozemky, realizace 2021				-	-	
	dokončení cyklostezek, zpevnění stezky do Bedřichovic				-	1 300	

C.2.3	Obnova aleje Tuřanka a okolo cyklostezky na Brno (možnost zapojení občanů do údržby, tzv. adopce zeleně)	Nízká	OISM	2020 - 2022	300	300	Rozpočet města/ dotace
	Investorem bude DSO Šlapanicko, realizace 11/2021				-	35	rozpočet města
					-	250	dotace
C.2.5	Prohloubit nebo upravit suchý poldr na Brněnských Polích	Nízká	OISM	2020	Nyní nelze určit	-	Rozpočet města/ dotace
	realizace 4/2020 v rámci rekonstrukce ulice Jungmannova, zničeno, nesouhlas obyvatel				-	-	-

Přehled průběžně realizovaných aktivit

Na konci každého roku budou u aktivit realizovaných průběžně specifikovány činnosti na následující rok.

A.1 Školství

Id.	Název aktivity/projektu	Důležitost	Garant	Termín realizace	Odhad nákladů na realizaci (v tis. Kč)	Zdroj financování
A.1.8	Oceňovací a odměňovací programy pro pedagogy	Střední	1.místostarosta/ ZŠ Šlapanice	Průběžně	100/ročně	Rozpočet města
	<i>nerealizováno kvůli financím a covidu</i>				-	
A.1.9	Podpora realizace místního akčního plánu rozvoje vzdělávání ORP Šlapanice II	Střední	Starostka/ 1.místostarosta	Průběžně	Náklady dle jednotlivých aktivit	-
	<i>2020 - Zapojení města Šlapanice do územní působnosti integrované strategie MAS Slavkovské bojiště</i>				-	
	<i>2021 - členství v řídicím výboru, aktivity jdou přes MŠ a ZŠ</i>				-	

A.2 Aktivní volný čas

Id.	Název aktivity/projektu	Důležitost	Garant	Termín realizace	Odhad nákladů na realizaci (v tis. Kč)	Zdroj financování
A.2.1	Podpora zájmových organizací a spolků <i>(podpora běžné činnosti a akcí, pomoc při zajištění vhodných prostor pro činnost)</i>	Vysoká	Starostka/ 1.místostarosta	Průběžně	900/ročně	Rozpočet města
	<i>dotace spolkům za rok 2020</i>				1500	rozpočet města
	<i>dotace spolkům za rok 2021</i>				1631	rozpočet města
A.2.7	Vytvoření fondu pro poskytování bezúročných půjček <i>(pro zkvalitnění zázemí, podpora investičních záměrů spolků a organizací. Deklarování garance na více let)</i>	Střední	Starostka/ 1.místostarosta	Průběžně	500/ročně	Rozpočet města
	<i>RM z finančních důvodů navrhuje přesunout realizaci od roku 2021, letos nebyla žádná žádost</i>					
	<i>RM z finančních důvodů navrhuje přesunout realizaci od roku 2023</i>					

A.3 Kultura ve městě

Id.	Název aktivity/projektu	Důležitost	Garant	Termín realizace	Odhad nákladů na realizaci (v tis. Kč)		Zdroj financování
A.3.1	Podpora pořádání společenských a kulturních akcí (podpora běžné činnosti a akcí)	Vysoká	Starostka/ 1.místostarosta	Průběžně	1 500/ročně		Rozpočet města
	kulturní akce za rok 2020 (ponížení v důsledku covid)				800		rozpočet města
	kulturní akce za rok 2021				694		rozpočet města
A.3.2	Vytvoření pracovního místa na MěÚ (koordinátor akcí ve městě včetně přípravy řešení akcí pro seniory a další cílové skupiny).	Střední	Starostka/ 1.místostarosta	Průběžně	-	400/ročně	Rozpočet města
	realizace v roce 2021				-	-	
	akce pro seniory řešeny přes Zdravé město				-	-	

A.4 Sociální a zdravotní služby

Id.	Název aktivity/projektu	Důležitost	Garant	Termín realizace	Odhad nákladů na realizaci (v tis. Kč)		Zdroj financování
A.4.3	Podpora k doplnění odborných zdravotnických pracovišť	Nízká	Starostka/ 1.místostarosta	Průběžně	Nyní nelze určit		Státní rozpočet
	Návrh Krajskému úřadu Jihomoravského kraje na vyhlášení VŘ na ambulantní péči stomatologa						
	Probíhají jednání o umístění nových ambulancí						
A.4.4	Rozvoj pečovatelské služby	Nízká	OS	Průběžně	Stanoveno zákonem		Rozpočet města/ dotace
	2020 - OS prověřil kapacity a pro rok 2020 není nutno je navyšovat - 84 klientů, 3,5 úvazku (65.RM)						
	2021 - není nutno navyšovat úvazky u pečovatelské služby –75 klientů k 30.9.2021 (přirozený úbytek a odchod do DD), 3,5 úvazku, žádost o dotaci na nový automobil						

B.1 Moderní úřad

Id.	Název aktivity/projektu	Důležitost	Garant	Termín realizace	Odhad nákladů na realizaci (v tis. Kč)	Zdroj financování
B.1.4	Rozvoj mikroregionální spolupráce	Střední	Starostka/	Průběžně	500/ročně	Rozpočet města
	(podpora DSO Šlapanicko, fungování v rámci BMO apod.)		1.místostarosta			
	Zapojení města Šlapanice do územní působnosti integrované strategie MAS Slavkovské bojiště					
	Zapojení města Šlapanice do DSO, podpora spolku Tady to mám rád, pomoc při odstranění následků tornáda					

B.3 Místní ekonomika

Id.	Název aktivity/projektu	Důležitost	Garant	Termín realizace	Odhad nákladů na realizaci (v tis. Kč)	Zdroj financování
B.3.2	Pravidelné jednání u kulatého stolu s podnikatelskými subjekty	Vysoká	Kancelář starostky	Průběžně	100/ročně	Rozpočet města
	<i>(komunikace mezi samosprávou a podnikatelským sektorem, informování o záležitostech ve městě ovlivňujících podnikání. Informování o možnostech partnerství, podpory akcí apod.)</i>					
	<i>společné jednání neproběhlo s ohledem na covid, probíhají individuální jednání dle potřeby, RM poskytla podporu v rámci pomoci dopadů s covidem: 30% sleva nájemného, bezplatná inzerce v médiích obce, splněno dle covid</i>					
	<i>společné jednání neproběhlo s ohledem na covid, probíhají individuální jednání dle potřeby, RM poskytla podporu v rámci pomoci dopadů s covidem: bezplatná inzerce v médiích obce do 30.6.2021, splněno dle covid</i>					

B.4 Rozvoj dopravy

Id.	Název aktivity/projektu	Důležitost	Garant	Termín realizace	Odhad nákladů na realizaci (v tis. Kč)	Zdroj financování
B.4.7	Úpravy systému parkování <i>(implementace analýzy dopravy v klidu včetně vize parkování – vytvoření projektů a vybudování parkovacích ploch v místech doporučených analýzou – volba vhodných technických způsobů parkování včetně rezidentního)</i>	Vysoká	Starostka/ 1.místostarosta/ OISM	Průběžně	Nyní nelze určit	Rozpočet města
	v roce 2020 realizována úprava parkování na Masarykově náměstí, Hřbitovní a Nerudové				61	rozpočet města
	v roce 2021 realizována úprava parkování u Zdravotního střediska, pasport parkovacích stání				17	rozpočet města
B.4.9	Bezbariérové město	Střední	Starostka/	Průběžně	Nyní nelze určit	Rozpočet města/dotace
	(implementace projektů a vybudování doporučených tras)		1.místostarosta/ OISM			
	2020 - bezbariérovost rekonstruovaných ulic - Jungmannova, Lipová					
	2021 - odložení akce Přechody Nádražní					
B.4.10	Stojany na kola <i>(implementace doporučení z analýzy dopravy v klidu a průzkumu cyklistických preferencí – poloha u vlakového nádraží, u Sokolovny, u autobusové zastávky Riegrova, na Masarykově náměstí, sportovního areálu, u hřbitova a u nové železniční zastávky)</i>	Nízká	OISM	Průběžně	Nyní nelze určit	Rozpočet města
	zahájení realizace přesunuto na rok 2021					
	nebylo zahájeno					
B.4.12	Podpora přestavby křižovatky Brno -Slatina, obchvat Slatiny a dalších významných dopravních opatření v nejbližším okolí města <i>(nutná spolupráce s Brnem, krajem, státem apod. Město Šlapanice není investorem staveb)</i>	Vysoká	Starostka/ 1.místostarosta	Průběžně	-	Jiné subjekty
	Probíhá jednání s JmK, připomínky k ZUR					
	Dokončení PD, příprava žádosti o dotaci (telematika), realizace 2022					

B.5 Technická infrastruktura a odpady

Id.	Název aktivity/projektu	Důležitost	Garant	Termín realizace	Odhad nákladů na realizaci (v tis. Kč)	Zdroj financování
B.5.1	Rekonstrukce veřejného osvětlení (bude řešeno v několika etapách postupně)	Vysoká	1.místostarosta/ SATESO	Průběžně	500/ročně	Rozpočet města/dotace
	2020 - provedeno na ulicích Jungmannova (cena v rekonstrukci ulice), Lipová, Nad Zámkem				298	
	2021 - Jiráskova, pasport, standardy a generel VO				1 086	rozpočet města
B.5.2	Snížení produkce odpadu ve městě (další pořízení sběrných nádob, budování a rekonstrukce sběrných míst, organizace svozu odpadu, propagace třídění)	Vysoká	1.místostarosta/ OISM	Průběžně	Nyní nelze určit	Rozpočet města/dotace
	dodatečně schválen projekt k financování DSO – zavedení door-to-door systému, z něhož město pořizuje popelnice pro nemovitosti, které budeme distribuovat v prosinci a štěpkovač. Předpokládané náklady 3,5 mil. Kč. Dotace proplácena až zpětně v roce 2022.				3 500	Rozpočet města/dotace
B.5.4	Přepojení zbývajících nemovitostí z jednotné na oddílnou kanalizaci	Nízká	OISM/SVK	Průběžně	200/ročně	Rozpočet města/dotace
	přepojeny nemovitosti v rámci akce Jungmannova na na ulici Kosmákova				-	
B.5.5	Realizace aktivit k úsporám energií a zdrojů (průběžná implementace doporučení vyplývajících z energetického auditu města, energetického auditu vybraných objektů, energetické náročnosti budov)	Nízká	OISM	Průběžně	Nyní nelze určit	Rozpočet města/dotace
	rekonstrukce střechy Zdravotního střediska				1 533	rozpočet města

C.1 Vzhled města

Id.	Název aktivity/projektu	Důležitost	Garant	Termín realizace	Odhad nákladů na realizaci (v tis. Kč)	Zdroj financování
C.1.9	Obnova studen ve městě (péče o vodní zdroje, využití na zalévání apod.)	Nízká	OISM	Průběžně	50/ročně	Rozpočet města/ dotace
	v roce 2020 realizována studna na Ponětovské				54	rozpočet města
	v roce 2020 realizována studna na Kalvodové, oprava Čechova a Kosmákova				99	rozpočet města

C.2 Životní prostředí

Id.	Název aktivity/projektu	Důležitost	Garant	Termín realizace	Odhad nákladů na realizaci (v tis. Kč)	Zdroj financování
C.2.2	Výsadba zeleně v okolí města <i>(výsadba biokoridorů, obnova polních cest, alejí podél cest a liniových krajinných prvků. Realizace na městských pozemcích po dohodě s hospodařícími zemědělci)</i>	Vysoká	OISM	Průběžně	200/ročně	Rozpočet města/ dotace
	2020 - projekt Dosadba stromů ve městě Šlapanice				23	rozpočet města
					162	dotace
	2021 - Tuřanka viz C.2.3, podpora výsadby Brontosaurus (následná péče)				-	rozpočet města

Legenda barevného rozlišení

Dokončené akce
Akce realizované nebo zahájena příprava
Akce nerealizované
